

荔湖街农村薄弱学校提升项目 绩效评价报告

2022 年

一、评价项目概述

（一）项目背景

广州市增城区荔湖街第一小学存在消防设施缺乏、学校教育装备不齐全、教学场室老旧，外墙贴面脱落、危房等问题，根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区农村薄弱学校提升实施方案的通知》（增府办函〔2022〕22号），属于农村薄弱学校。通过实施荔湖街农村薄弱学校提升项目可以实现薄弱学校的教育基础设施水平整体提升，促进增城区义务教育优质均衡发展。

（二）项目立项依据

根据广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区农村薄弱学校提升实施方案的通知》（增府办函〔2022〕22号）、《荔湖街党工委会议纪要》（荔湖委会纪[2022]31号），同意实施该项目。

（三）项目绩效目标

项目立项绩效目标为实现薄弱学校的教育基础设施水平整体提升，促进增城区义务教育优质均衡发展。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源为增城区财政统筹资金，估算投资金额为3,930,000.00元，经中量工程咨询有限公司审定的项目概算金额为3,787,567.14元。

2022年广州市增城区人民政府荔湖街道办事处收到增

城区下拨项目资金 1,800,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日
总共支出项目资金 1,800,000.00 元，预算执行率为 100%。

（五）项目实施情况

项目主管单位为广州市增城区教育局，实施单位为广州市增城区人民政府荔湖街道办事处。

项目根据《关于印发<荔湖街建设工程管理试行办法>的通知》的规定，已按程序完成施工图设计、概算评审、监理发包、施工招投标等工作，项目于 2022 年 10 月 23 日开工，2022 年 11 月 21 日完工，2022 年 11 月 22 日经组织建设单位、施工单位、监理单位、设计单位验收合格后进入质保期。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

本次评价是深入贯彻《广州市关于深化预算管理制度改革的实施意见》的有关要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过对 2022 年度荔湖街农村薄弱学校提升项目财政支出决策、过程、产出、效益及服务对象满意度五个方面进行客观、公正的评价，总结项目整体支出过程中的经验，发现问题，提出改进项目整体支出投入、过程的具体建议，强化结果导向和绩效意识，落实主体责任，确保项目建设资金依法合规使用，提高投资效益。

（二）评价设计与实施

本次绩效评价根据具体实施内容制定了绩效评价指标

体系。指标体系的制定以《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)等相关文件为依据，运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，评价内容包括的决策、过程、产出、效益及服务对象满意度五个方面。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

各项指标定义、评分标准和评分细则如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
决策	项目立项	立项依据充分性	-	2	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 6. 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		立项程序规范性	-	2	1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 所提交的文件、材料符合相关要求； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若 1、2、3 齐全得权重 100%；如不符合 1 得 0 分；缺 2 扣权重 1/3.；缺 3 扣权重 1/3.。
	绩效目标	绩效目标合理性	-	2	1. 项目有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4. 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5. 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	-	2	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 指标值清晰、可衡量； 3. 指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 4. 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
过程	资金投入	预算编制科学性	-	1	1. 预算编制经过科学论证; 2. 预算内容与项目内容匹配; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 5. 项各占 1/4 权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。
		资金分配合理性	-	1	1. 项目资金分配符合相关分配办法得 0.5 分; 2. 根据资金分配合理程度, 得剩余的 0.5 分。
	资金管理	资金到位率	-	2	资金到位率达 100%得相应权重的 100%, 每下降 1%扣 5%权重, 扣完相应权重为止。
		资金到位时效性	-	2	及时到位得 1 分, 未及时到位但未影响项目进度得 0.5 分, 未及时到位并项目进度得 0-0.5 分。
		预算执行率	-	2	本指标得分=(预算执行率-90%)/(100%-90%)×10, 低于 90%不得分, 并不得评优。
		资金使用合规性	-	4	1. 符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 5. 项全部符合视为使用合规, 得满分; 存在 1 或 3 或 4 不满足时属于严重违规事项, 本项指标不得分; 在 1、3、4 同时符合, 2 不符合时, 本项指标得 75%权重分;
	组织实施	管理制度健全性	-	4	1. 制定或具有相应的财务管理制度; 2. 制定或具有相应的业务管理制度; 3. 财务管理制度合法、合规、完整; 4. 业务管理制度合法、合规、完整。 5. 项各占 1/4 权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)
		制度执行有效性	-	4	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 5. 项全部符合视为使用合规, 得满分; 存在 1 不满足时属于严重违规事项, 本项指标不得分; 在 1 符合, 2 或 3 或 4 不符合时, 本项指标得 75%权重分;
产出	产出数量	实际完成率		10	计划产出数的计算依据为编制单位编制概预算书, 实际产出数的计算依据为结算评审书, 如无结算评审书则参考其他证明材料。项目实际完成率达 100%, 则得 10 分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。
	产出质量	质量达标率	综合楼验收合格率	4	每个项目质量达标率达 100%, 则得 4 分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
			教学楼验收合格率	4	计算依据：项目完成及时率=合同约定完工期限/实际完工期限*100%。 每个项目完成及时率达100%，则得2分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。
			室外工程验收合格率	4	
	产出时效	完成及时率	综合楼形象进度完成率	4	
			教学楼形象进度完成率	4	
			室外工程形象进度完成率	4	
	产出成本	成本节约率	工程成本节约率	6	
效益	产生效益	社会效益	消除校园安全隐患	10	根据项目实施前后环境程度酌量给分。
		可持续影响指标	提升农村薄弱地区学校办学条件	10	根据项目推动教育优质均衡发展程度酌情给分，满分10分。
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度		4	满意度满分得分4分；满意率=100%，得分4分；满意率<100%，得分=满意率/100%*4分；
		学生满意度		4	满意度满分得分4分；满意率=100%，得分4分；满意率<100%，得分=满意率/100%*4分；
		周边居民满意度		4	满意度满分得分4分；满意率=100%，得分4分；满意率<100%，得分=满意率/100%*4分；

根据广州市增城区财政支出绩效评价指标体系的规定，评价结果分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下图：

项目	优	良	中	差
分值	[90, 100]	[80, 90)	[60, 80)	<60

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

该项目绩效评价得分 95.5 分，根据广州市增城区财政支出绩效评价指标体系的规定，评价结果等级为优。绩效得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	-	2.00	2.00	100.00%
		立项程序规范性	-	2.00	2.00	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	-	2.00	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	-	2.00	2.00	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	-	1.00	1.00	100.00%
		资金分配合理性	-	1.00	1.00	100.00%
过程	资金管理	资金到位率	-	2.00	2.00	100.00%
		资金到位时效性	-	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	-	2.00	2.00	100.00%
		资金使用合规性	-	4.00	4.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	-	4.00	4.00	100.00%
		制度执行有效性	-	4.00	3.50	87.50%
产出	产出数量	实际完成率		10.00	10.00	100.00%
	产出质量	质量达标率	综合楼验收合格率	4.00	4.00	100.00%
			教学楼验收合格率	4.00	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
			室外工程验收合格率	4.00	4.00	100.00%
	产出时效	完成及时率	综合楼形象进度完成率	4.00	4.00	100.00%
			教学楼形象进度完成率	4.00	4.00	100.00%
			室外工程形象进度完成率	4.00	4.00	100.00%
	产出成本	成本节约率	工程成本节约率	6.00	6.00	100.00%
效益	产生效益	社会效益	消除校园安全隐患	10.00	8.00	80.00%
		可持续影响指标	提升农村薄弱地区学校办学条件	10.00	8.00	80.00%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度		4.00	4.00	100.00%
		学生满意度		4.00	4.00	100.00%
		周边居民满意度		4.00	4.00	100.00%
合计				100.00	95.50	95.50%

（二）项目绩效分析

1、项目立项情况

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
立项依据充分性	2	充分	充分	2	100%
立项程序规范性	2	规范	规范	2	100%
合计	4			4	100%

该三级指标设置分值4分，得分4分，扣0分。

2、绩效目标情况

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
绩效目标合理性	2	合理	较合理	2	100%
绩效指标明确性	2	明确	较明确	2	100%
合计	4			4	100%

该三级指标设置分值 4 分，得分 3 分，扣 0 分。

3、资金投入情况

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
预算编制科学性	1	科学	科学	1	100%
资金分配合理性	1	合理	合理	1	100%
合计	2			2	100%

该三级指标设置分值 2 分，得分 2 分，扣 0 分。

4、项目资金管理情况

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
资金到位率	2	100%	100%	2	100%
资金到位时效性	2	效率	效率	2	100%
预算执行率	2	100%	86.29%	2	100%
资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
合计	10			10	100%

该三级指标设置分值 10 分，得分 10 分，扣 0 分。

5、组织实施情况分析

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
制度执行有效性	4	有效	较有效	3.5	100%
合计	8			7.5	100%

该三级指标设置分值 8 分，得分 7.5 分，扣 0.5 分。

扣分项：

存在未按合同款项及时支付费用的情况，如施工合同约定完成工程类 100%后，应支付施工单位 70%费用，该项目已在 2022 年完成竣工验收，但仅支付 52%费用，扣 0.5 分

6、项目产出数量情况分析

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
实际完成率	10	100%	100%	10	100%
合计	10			10	100%

该三级指标设置分值 10 分，得分 10 分，扣 0 分。

注：截止 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未完成结算评审，因此本次依据监理单位出具的监理月报确定实际的完成量。

7、项目产出质量情况分析

三级指标	四级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
质量达标率	综合楼验收合格率	4	100%	100%	4	100%
	教学楼验收合格率	4			4	100%
	室外工程验收合格率	4			4	100%
合计		12			12	100%

该三级指标设置分值 12 分，得分 12 分，扣 0 分。

8、项目产出时效情况分析

三级指标	四级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
完成及时率	综合楼形象进度完成率	4	100%	100%	4	100%
	教学楼形象进度完成率	4			4	100%
	室外工程形象进度完成率	4			4	100%
合计		12			12	100%

该三级指标设置分值 12 分，得分 12 分，扣 0 分。

9、项目产出成本情况分析

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
成本节约率	6	100%	100%	6	100%
合计	6			6	100%

该三级指标设置分值 6 分，得分 6 分，扣 0 分。

注：项目尚未进行结算评审，根据工程项目的情况资料，未发现项目结算价超概算的情况，因此本次得满分，得 6 分；

10、项目效益情况分析

三级指标	四级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
社会效益	消除校园安全隐患	10	程度	较好	8	80%
可持续影响指标	提升农村薄弱地区学校办学条件	10	程度	较好	8	80%
合计		20			16	100%

该三级指标设置分值 20 分，得分 16 分，扣 4 分。

扣分项：

① 社会效益

根据现场复核及评价，能达到消除校园安全隐患的效果，达到的社会效益程度较好，得 8 分，扣 2 分。

② 可持续影响指标

项目能在一定程度上提升农村薄弱地区学校的办学条件，可持续性程度较好，得 8 分，扣 2 分。

11、满意度分析

三级指标	四级指标	分值	标杆值	完成情况	得分	得分率
社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	4	100%	100%	4	100%
	学生满意度	4	100%	100%	4	100%
	周边居民满意度	4	100%	100%	4	100%
合计		12			12	100.0%

该三级指标设置分值 12 分，得分 12 分，扣 0 分。

四、项目主要绩效或成功经验

该项目通过对农村薄弱学校的升级改造，消除了校园各类安全隐患，提升教育基础设施水平，达到促进增城区义务教育优质均衡发展的目的。

五、存在问题或不足

项目总概算为 3,787,567.14 元，于 2022 年立项并完工，

但 2022 年仅安排 1,800,000.00 元财政资金，导致项目未能按照签订的合同要求及时支付款项。

六、相关建议

项目实施单位应科学合理规划预算资金，建议合理规划使用财政资金，建立健全预算监控体系，实时追踪预算执行情况，并分析计划执行情况与实际执行情况的差异，了解差异存在的关键原因，根据项目实施情况及时申请调整资金，整合财政资源，密切监控项目执行情况，采取科学合理的解决方式和改进措施更好的发挥财政资金的使用效益。

附件

- 1、绩效评分表
- 2、满意度调查结果。

广州市增信鸿日会计师事务所有限公司

2023 年 6 月 28 日

2022年荔湖街农村薄弱学校提升项目支出绩效重点评价表

(2022年度)

主管部门		广州市增城区教育局			实施单位	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	
项目名称		荔湖街农村薄弱学校提升项目				一级 ☐ 二级 ☒	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	测评情况（得、扣分原因）	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	-	2	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 6. 项各占1/5权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。	有相关同意实施的会议纪要和领导同意的关于实施的请示等资料。 1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，本指标得0.2分； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求，本指标得0.2分； 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，本指标得0.2分； 4. 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，本指标得0.2分； 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，本指标得0.2分；	2.00
			-	2	1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 所提交的文件、材料符合相关要求； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若1、2、3齐全得权重100%；如不符合1得0分；缺2扣权重1/3.；缺3扣权重1/3。	有相关同意实施的会议纪要和关于实施的请示等资料。 1. 项目按照规定的程序申请设立，本指标得0.34分； 2. 所提交的文件、材料符合相关要求，本指标得0.33分； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，本指标得0.33分；	2.00
			-	2	1. 项目有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； 4. 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5. 项各占1/4权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。	1. 项目有绩效目标，本指标得0.5分； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，本指标得0.5分； 3. 绩效目标体现项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本指标得0.5分； 4. 绩效目标体现与预算确定的项目投资额或资金量的匹配程度，本指标得0.5分；	2.00
	绩效目标	绩效指标明确性	-	2	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 指标值清晰、可衡量； 3. 指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 4. 项各占1/3权重，每有一项不满足，则扣除相应权重。	1. 自评报告中项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，本指标得0.67分； 2. 项目绩效目标部分指标值设置合理的内容，指标值清晰、可衡量，本指标得0.67分； 3. 项目绩效目标设定的指标值与项目立项时年度任务数或计划数相对应，本指标得0.66分；	2.00

2022年荔湖街农村薄弱学校提升项目支出绩效重点评价表
(2022年度)

主管部门		广州市增城区教育局			实施单位		广州市增城区人民政府荔湖街道办事处			
项目名称		荔湖街农村薄弱学校提升项目			项目级次		一级 ☐ 二级 ☒			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	测评情况（得、扣分原因）		得分		
资金投入		预算编制科学性	-	1	1. 预算编制经过科学论证; 2. 预算内容与项目内容匹配; 3. 预算额度测算依据充分,按照标准编制; 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配; 5. 项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	根据提供的概算资料, 1. 预算编制经过科学论证,本指标得0.25分; 2. 预算内容与项目内容匹配,本指标得0.25分; 3. 预算额度测算依据充分,按照标准编制,本指标得0.25分; 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,本指标得0.25分;		1.00		
					1. 项目资金分配符合相关分配办法得0.5分; 2. 根据资金分配合理程度,得剩余的0.5分。	1. 项目资金分配符合相关分配办法,本指标得0.5分; 2. 资金分配合理,本指标得0.5分;	1.00			
					资金到位率	-	2	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	该项目资金由增城区级资金组成,资金已及时下拨至荔湖街财政,资金到位率=100%,本指标得1分;	2.00
					资金到位时效性	-	2	及时到位得1分,未及及时到位但未影响项目进度得0.5分,未及及时到位并项目进度得0-0.5分。	项目通过当年批复后,资金已及时到位,得2分;	2.00
					资金管理	预算执行率	-	2	本指标得分=(预算执行率-90%)/(100%-90%)×10,低于90%不得分,并不得评优。	预算资金1,800,000.00元,实际支出1,800,000.00元,预算执行率100%,得2分;
过程		资金使用合规性	-	4	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 5. 项全部符合规定为使用合规,得满分;存在1或3或4不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在1、3、4同时符合,2不符合时,本项指标得75%权重分;	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定,本指标得1分; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续,本指标得1分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途,本指标得1分; 4. 暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本指标得1分;		4.00		
					管理制度健全性	-	4	1. 制定或具有相应的财务管理制度; 2. 制定或具有相应的业务管理制度; 3. 财务管理制度合法、合规、完整; 4. 业务管理制度合法、合规、完整; 5. 项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	1. 制定或具有相应的财务管理制度,本指标得1分; 2. 制定或具有相应的业务管理制度,本指标得1分; 3. 财务管理制度合法、合规、完整,本指标得1分; 4. 业务管理制度合法、合规、完整,本指标得1分;	4.00

2022年荔湖街农村薄弱学校提升项目支出绩效重点评价表
(2022年度)

主管部门	广州市增城区教育局			实施单位	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处		
项目名称	荔湖街农村薄弱学校提升项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	测评情况 (得、扣分原因)	得分
产出	组织实施	制度执行有效性	-	4	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 5. 项全部符合使用合规, 得满分; 存在1项不满足时属于严重违规事项, 本项指标不得分; 在1符合, 2或3或4不符合时, 本项指标得75%权重;	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定, 本指标得1分; 2. 项目调整及支出调整手续完备, 但存在未按合同款项及时支付费用的情况, 扣0.5分, 本指标得0.5分; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 本指标得1分; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 本指标得1分。	3.50
	产出数量	实际完成率		10	计划产出数的计算依据为编制单位编制预算书, 实际产出数的计算依据为结算评审书, 如无结算评审书则参考其他证明材料。 每个项目实际完成率100%, 则得10分, 每低于1%, 扣除5%权重, 扣完为止。	根据监理月报, 工程实际完成率100%, 得10分;	10.00
	产出质量	质量达标率	综合楼验收合格率	4	每个项目质量达标率达100%, 则得4分, 每低于1%, 扣除5%权重, 扣完为止。	该项目已完成验收, 验收合格且出具了报告, 得12分。	4.00
			教学楼验收合格率	4			4.00
			室外工程验收合格率	4			4.00
	产出时效	完成及时率	综合楼形象进度完成率	4	计算依据: 项目完成及时率=合同约定完工工期/实际完工期限*100%。 每个项目完成及时率达100%, 则得2分, 每低于1%, 扣除5%权重, 扣完为止。	合同约定工期30天, 实际工期28天, 完成及时率100%, 得4分; 合同约定工期30天, 实际工期28天, 完成及时率100%, 得4分; 合同约定工期30天, 实际工期28天, 完成及时率100%, 得4分;	4.00
			教学楼形象进度完成率	4			4.00
			室外工程形象进度完成率	4			4.00
	产出成本	成本节约率	工程成本节约率	6	计划成本计算依据为建安费概算评审价, 实际成本计算依据为结算评审价。每个项目成本节约率大于0%且低于1.5%, 则得6分, 每高于(1.5%)或低于(0%)1%, 扣除5%权重, 扣完为止。	项目尚未进行结算评审, 根据工程项目的情况资料, 未发现项目结算价超概算的情况, 因此本次得满分, 得6分;	6.00

2022年荔湖街农村薄弱学校提升项目支出绩效重点评价表

(2022年度)

(2022年度)						
主管部门		广州市增城区教育局			实施单位	
项目名称		荔湖街农村薄弱学校提升项目			项目级次	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	测评情况（得、扣分原因）
效益	产生效益	社会效益	消除校园安全隐患	10	根据项目实施前后环境程度酌量给分。	根据提供的项目实施前后图片对比，能达到消除校园安全隐患的效果，得8分；
		可持续影响指标	提升农村薄弱地区学校办学条件	10	根据项目推动教育优质均衡发展程度酌情给分，满分10分。	项目能在一定程度上提升农村薄弱地区学校的办学条件，得8分；
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度		4	满意度满分得分4分；满意度=100%，得分4分；满意度<100%，得分=满意度/100%*4分；	本次共发放并回收100份问卷，其中教师14份，学生27份，周边居民59份，统计满意度为100%，合计得12分；
		学生满意度		4	满意度满分得分4分；满意度=100%，得分4分；满意度<100%，得分=满意度/100%*4分；	
		周边居民满意度		4	满意度满分得分4分；满意度=100%，得分4分；满意度<100%，得分=满意度/100%*4分；	
评价结果		累计得分：95.5分				
绩效等级		优				



附件 2

满意度调查结果

一、基本情况

调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等。

调查目的：调查群众对广州市增城区荔湖街第一小学升级改造工程实施效果的满意情况；

调查对象范围：荔湖街农村薄弱学校提升项目受益群众，包括教师、学生及周边居民；

样本数量：共计 100 份；

调查方式：对受益群众进行不记名问卷调查，调查内容主要为对工程项目中教学楼、综合楼、室外工程的整体效果、外观设计、使用功能及其他的满意情况；


抽样方法：随机抽样。

二、调查结果

（一）荔枝景观大道两旁环境优化提升工程项目调查结果


第 1 题 您的身份类别：

选项	小计	比例
教师	30	 30%
学生	40	 40%
周边居民	30	 30%
本题有效填写人次	100	

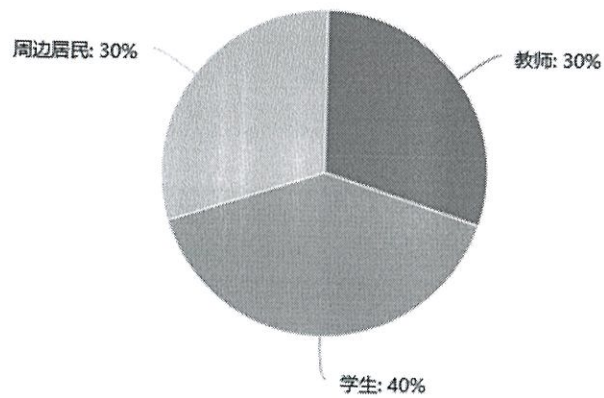

第 2 题 您对教学楼以下项目内容是否满意:


题目\选项	是	否
整体效果	100(100%)	0(0%)
外观设计	100(100%)	0(0%)
使用功能	100(100%)	0(0%)
其他	100(100%)	0(0%)

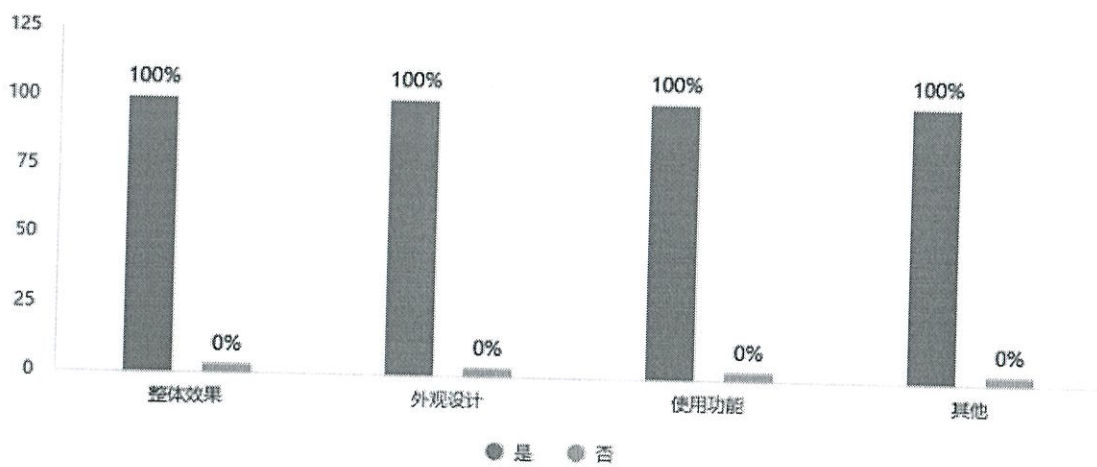

第 3 题 您对综合楼以下项目内容是否满意:

题目\选项	是	否
整体效果	100(100%)	0(0%)
外观设计	100(100%)	0(0%)
使用功能	100(100%)	0(0%)

其他	100(100%)	0(0%)
----	-----------	-------

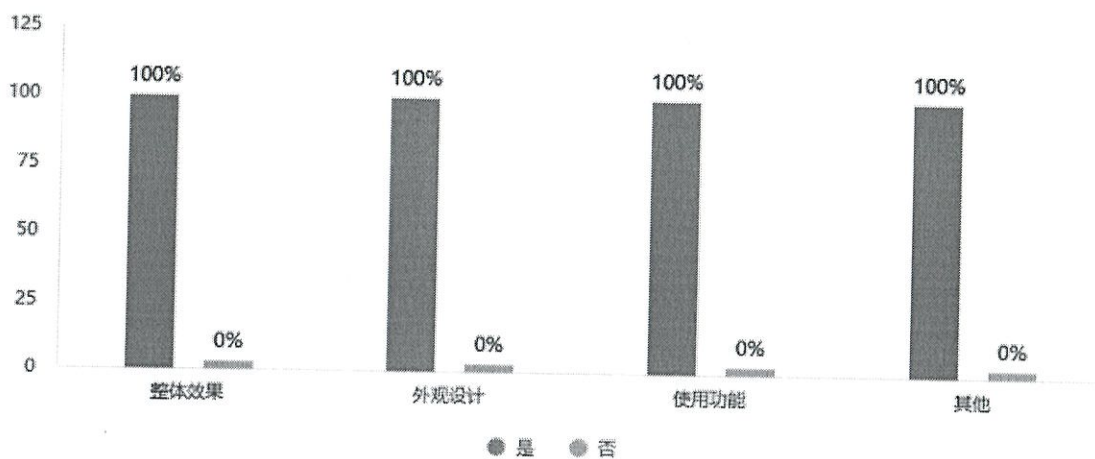

第 4 题 您对室外工程以下项目内容是否满意:

题目\选项	是	否
整体效果	100(100%)	0(0%)
外观设计	100(100%)	0(0%)
使用功能	100(100%)	0(0%)
其他	100(100%)	0(0%)

